Priprava projektne naloge
za načrtovanje "Digitalne MAG-NETic platforme"

Načrt dela

Rezultat Faze I

Junij 2026

Dokument je pripravil zavod Servis 8

Kazalo

Uvod

Namen in cilji projekta

O dokumentu

Obseg dela

Faze, aktivnosti, predvideni rezultati, mejniki

Časovnica

Prilagoditve procesa

Organizacija dela

Organizacija projektnih skupin

Komunikacija

Uvod

Namen in cilji projekta

V okviru projekta MAG-NET je predviden razvoj Digitalne MAG-NETic platforme, ki bo krovni spletni prostor za delovanje in storitve MAG-NET HUB-a, ta pa bo del DOMA ustvarjalnih skupnosti (v nadaljevanju DOM). Zasnovana bo tako, da bo podpirala povezovanje različnih vsebin, storitev, programov, podpornih aktivnosti in uporabnikov, ki bodo del širšega ekosistema DOMA.

Namen projekta je pripraviti projektno nalogo, ki bo zajemala izhodišča za načrtovanje platforme pri čemer je potrebno v procesu razvoja uskladiti in poenotiti pričakovanja in vizijo platforme med različnimi deležniki.

Cilji projektne naloge so:

- uskladiti potrebe in pričakovanja ključnih deležnikov,
- poenotiti razumevanje vloge platforme med ključnimi deležniki,
- opredeliti obseg platforme (in storitev, ki jih bo podpirala),
- pripraviti smernice za razvoj uporabniške izkušnje,
- opredeliti način upravljanja platforme,
- pripraviti popis tehničnih zahtev za razvoj platforme,
- pripraviti zahteve za pravno skladnost.

Projektna naloga mora zagotavljati dovolj podrobnih informacij, da bo služila kot podlaga za nadaljnje faze zasnove uporabniške izkušnje, grafičnega vmesnika in programiranja spletne platforme.

O dokumentu

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene načrtovane faze, aktivnosti, predvideni rezultati in mejniki projekta. Poleg obsega dela je predstavljena tudi organizacija dela, ki je bila usklajena z naročnikom na uvodnih srečanjih.

Vsebinsko dokument temelji na vsebini Povabila k oddaji ponudbe in je prilagojen glede na vhodne informacije, ki so bile podane ob začetku sodelovanja.

Obseg dela

FAZA I: PRIPRAVA NAČRTA DELA IN RAZISKOVALNI NAČRT

Ključne aktivnosti faze:

- spoznavanje deležnikov projektne skupine,
- vzpostavitev pričakovanj,
- pregled vhodnih informacij, podanih s strani naročnika,
- prilagoditev procesa in aktivnosti,
- načrtovanje raziskovalnih aktivnosti.

Pričakovani rezultati faze:

- načrt dela,
- načrt raziskave.

Mejnik M1: Potrjen načrt dela in raziskovalni načrt

FAZA II: ANALIZA POTREB

Ključne aktivnosti faze:

- namizna raziskava: pregled in interpretacija s strani naročnika prejetega gradiva,
- pregled dobrih (domačih in tujih) praks,
- analiza vizualnih zasnov (CGP, označevanje),
- načrtovanje in izvedba intervjujev s ključnimi deležniki (do 10),
- sinteza raziskovalnih aktivnosti.

Pričakovani rezultati faze:

- priprava povzetka ugotovitev, ključnih potreb in tveganj,
- shema deležnikov,
- opredelitev uporabniških skupin ter opis njihovih potreb, pričakovanj in ključnih scenarijev uporabe,
- opredelitev procesov in storitev, ki jih mora platforma podpreti,
- osnutek tehničnih zahtev.

Mejnik M2: Dokument s povzetki intervjujev in delavnic, ključnimi ugotovitvami in izsledki ter priporočeni nadaljnji vsebinski koraki za pripravo osnutka obsega in strukture platforme.

FAZA III: KONCEPTUALNA ZASNOVA PLATFORME IN VIZUALNE PODOBE

Ključne aktivnosti faze:

- iteracija in validacija uporabniških scenarijev,
- usklajevanje s ključnimi deležniki,
- usklajevanje s standardi spletnih storitev (med drugim WCAG standardi dostopnosti)
- delavnice z različnimi deležniškimi in uporabniškimi skupinami za validacijo in razvoj konceptov,
- razvoj koncepta nadgradnje vizualne identitete.

Pričakovani rezultati faze:

- arhitektura platforme s predlagano strukturo vsebin in navigacije,
- preverjeni uporabniški scenariji platforme,
- usklajen nabor digitalnih storitev platforme,
- seznam prioritiziranih funkcionalnosti platforme
- priporočila za razvoj UX in implementacijo,
- usklajen in potrjen koncept vizualne identitete in pravil uporabe.

Mejnik M3: Osnutek obsega in strukture platforme z izhodišči za vizualno identiteto.

FAZA IV: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ključne aktivnosti faze:

- priprava tehničnih specifikacij na podlagi obsega platforme in uporabniških potreb,
- usklajevanje tehničnih zahtev s ključnimi deležniki upravljanja,
- analiza in priprava priporočil za uporabo različnih (obstoječih) sistemov.

Pričakovani rezultati faze:

- arhitekturni model MAG-NET Hub,
- MAG-NET Hub sitemap,
- seznam in opis tehničnih funkcionalnosti s predlogom prioritet,
- model uporabniških vlog in matrike pravic,
- priporočila za seznam minimalnih tehničnih zahtev za:
  - razvoj,
  - podatkovne strukture,
  - informacijsko varnost,
  - upravljanje zasebnosti in podatkov,
- seznam priporočil za učinkovit online rezervacijski sistem,
- tehnična opredelitev osnovnega plačilnega sistema platforme za spletno prodajo izdelkov in vstopnic.

Mejnik M4: Osnutek funkcionalnih in tehničnih zahtev in ovrednotenje predlaganih rešitev.

FAZA V: FINALIZACIJA

Ključne aktivnosti faze:


- združevanje vsebinskih in tehničnih specifikacij,
- usklajevanje in potrjevanje vsebin s ključnimi deležniki,
- priprava dokumenta za razpis,
- evalvacija sodelovanja na projektu.

Pričakovani rezultati faze:

- dokument z vsebinskimi in tehničnimi izhodišči za načrtovanje platforme MAG-NET.

Mejnik M5: Končna projektna naloga s prilogami in "popisom del", ki ustreza za objavo kot prilago javnemu naročilu

Časovnica

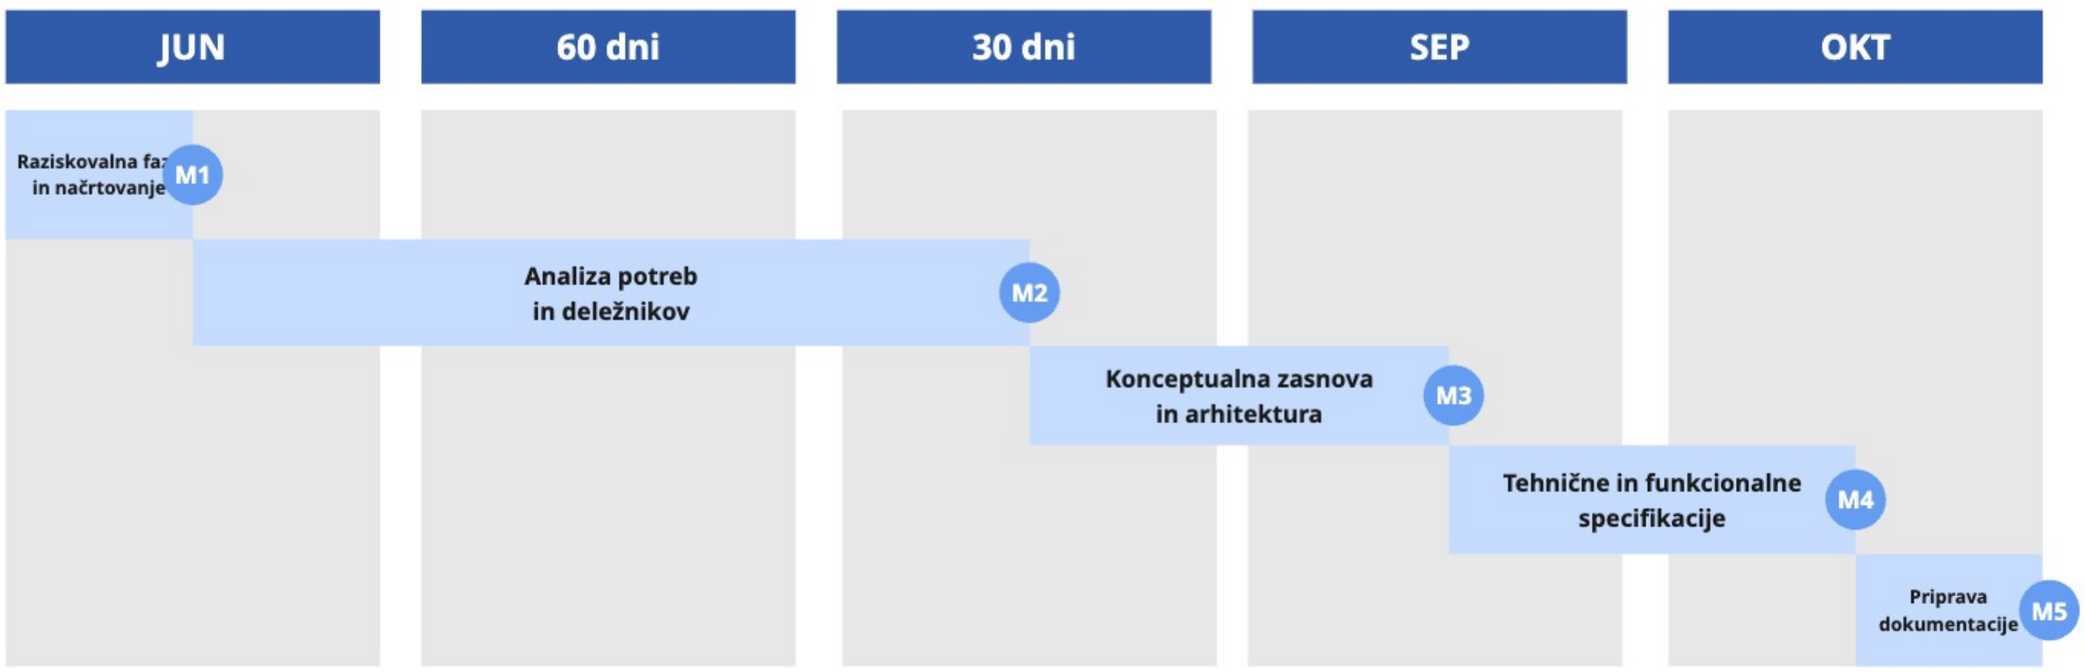

Mejniki faz s predvidenim časovnim obsegom

- **M1** *15 dni od podpisa pogodbe*
- **M2** *60 dni od potrditve M1*
- **M3** *30 dni od potrditve M2*
- **M4** *30 dni od potrditve M2*
- **M5** *15 dni od potrditve M2*

Prilagoditve procesa

V načrtu dela so opredeljene faze in aktivnosti predstavljene linearno, na podlagi vhodnih informacij, ki jih je zagotovil naročnik. V kolikor bodo tekom projekta identificirane nove potrebe ali zahteve se bodo aktivnosti procesa prilagodile.

Organizacija dela

Z namenom zagotavljanja učinkovitosti bo sodelovanje na projektu organizirano v dve projektni skupini: Ožja projektna skupina (OPS) in Širša projektna skupina (ŠPS).

Ožja projektna skupina se redno srečuje, aktivno soustvarja in sodeluje pri različnih aktivnostih ter potrjuje in sprejema odločitve tekom projekta.

Širša projektna skupina se vključuje pri vsebinsko relevantnih delih procesa, je redno obveščena o aktivnostih in rezultatih procesa ter podaja informacije na pripravljene predloge. Srečanj ožje projektne skupine se udeležuje po potrebi.

Člani OPS in njihve vloge

Monika Tominšek, sovodja MAG-NET in Dom, vodja službe za razvoj na Mestni občini Celje

Tadej Perčič, direktor Mladinskega centra Celje

Luka Piškorič, načrtovalec Doma in MAG-NET HUB-a, Poligon

Samo Seničar, podžupan Mestne občine Celje

Danijel Kurinčič, načrtovalec uporabniške izkušnje, Servis 8

Maja Repotočnik, načrtovalka uporabniških raziskav, Servis 8

Ana Kyra Bekš, vodja projekta, Servis 8

Člani ŠPS in njihve vloge

Tanja Tamše, sovodja projekta MAG-NET, Služba za razvoj na Mestni občini Celje

Milana Simonič, komunikacijska podpora projekta MAG-NET, Služba za razvoj na Mestni občini Celje

Dušan Kneževič, strokovnjak za IT, Služba za razvoj na Mestni občini Celje

Samo Bračić, IT strokovnjak, Servis 8

Marko Horvat, grafični oblikovalec in ilustrator, Servis 8

Novi sodelavci DOMA, ko se bodo pridružili tekom procesa

Komunikacija

Na uvodnem srečanju je bila opredeljena komunikacija med člani OPS in ŠPS in sicer:

- določeni so bili datumi srečanj OPS do faze III,
- vzpostavljen je bil komunikacijski kanal za asinhrono komunikacijo,
- predstavljeno je bilo orodje za spletno soustvarjanje (Miro),
- določene so bile druge aplikacije za deljenje datotek in informacij.
